



京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港南本牧地区岸壁(-18m) (耐震) 築造工事(その2)
 工 期 平成27年10月15日～平成28年 3月30日
 施工会社 東亜・本間・大本特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、横浜港南本牧ふ頭地区整備事業として、
 鋼板セル工法で岸壁を築造する工事です。

●工事箇所の詳細図



●今月の工事予定

内容	平成28年3月						備考
	5	10	15	20	25	31	
本體工 アーク設置	[Progress bar from 5 to 10]						
本體工 アーク中詰	[Progress bar from 5 to 10]						
本體工 継手処理	[Progress bar from 10 to 15]						
本體工 石籠据付	[Progress bar from 15 to 20]						
付屬工 電気防食	[Progress bar from 15 to 20]						
後片付工	[Progress bar from 20 to 31]						

●お知らせ

今月は本體工のアーキ設置、中詰、継手処理、石籠据付及び付屬工の電気防食を施工します。工事は今月末で完了です。近隣の皆様には大変ご不便をお掛けしますが、工事へのご理解とご協力をよろしくお願い致します。

今月の作業内容

写真①

【鋼板セル据付】

富津ヤードで製作した鋼板セル(直径24.5m 高さ32m 重量約400t)を起重機船で運搬し、南本牧MC-4岸壁に据え付けます。

起重機船
(1400 t 吊)

【鋼板セル中詰】

据え付けた鋼板セルを安定させるため、リクレーマ船で中詰材(千葉県産の砂岩ズリ)を投入します。

リクレーマ船
(1500m³/h)




写真②


【アーキ設置】

据付した鋼板セルの間にアーキ (R8.23m 高さ32m 重量約70t)を起重機船で設置します。

標準断面図

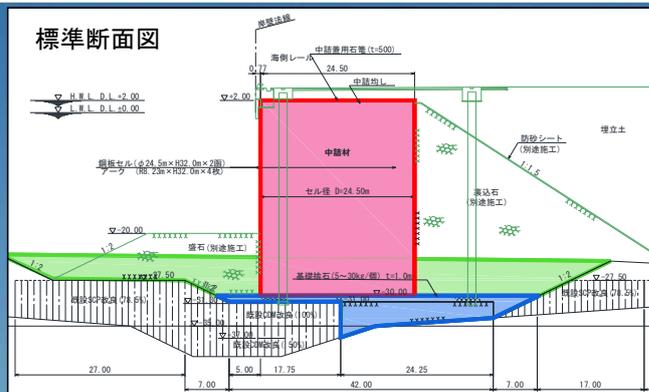

起重機船
(1800 t 吊)

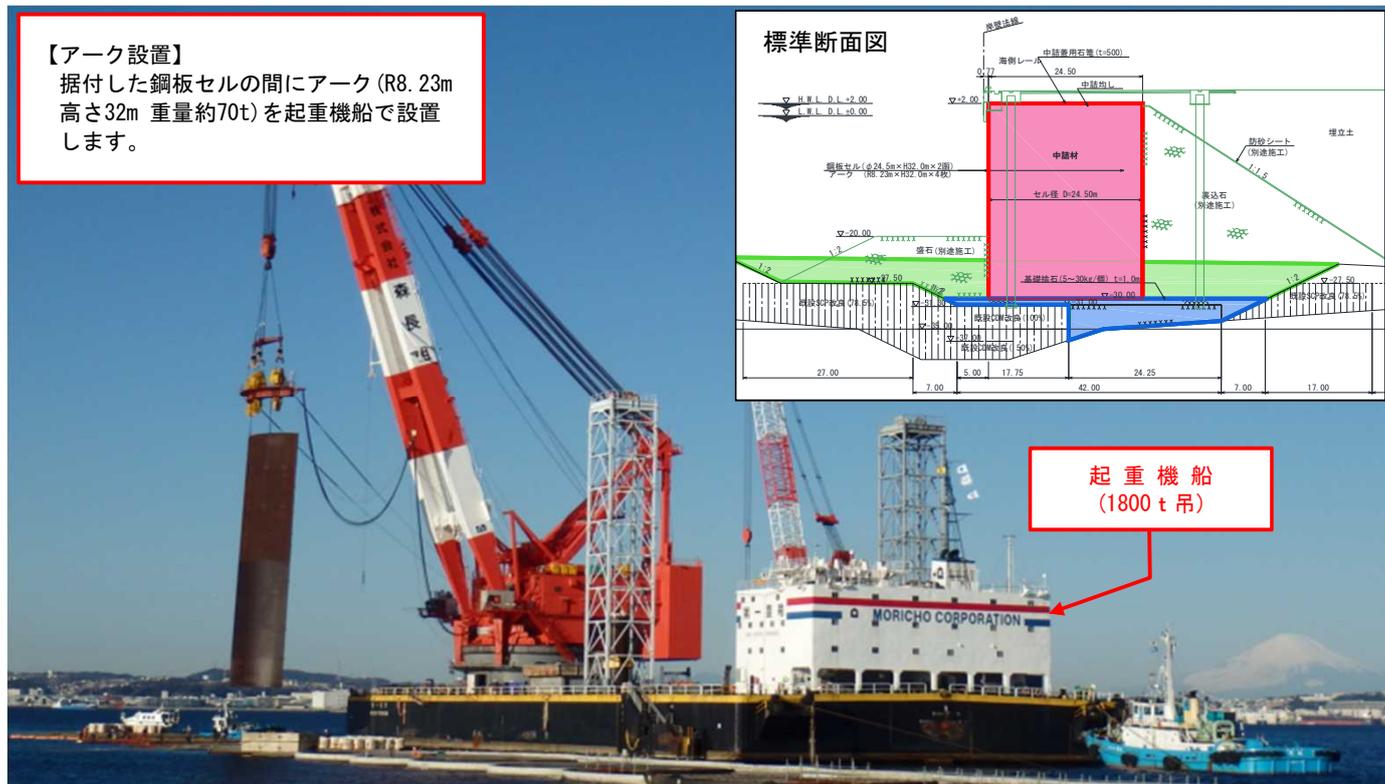

引き続き安全を最優先し、無事故・無災害で竣工できるように、工事を進めていきます。
