


京浜港湾事務所


南本牧地区MC3・MC4コンテナヤードの入出場管理施設を整備するため、舗装工等を施工します。



● 入出場管理施設のイメージ



● 工事箇所の全体図

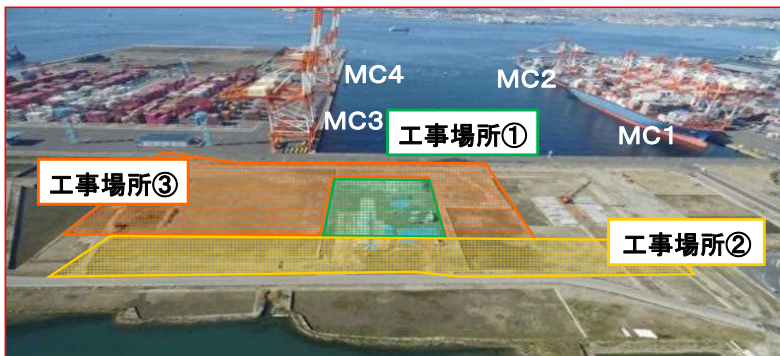

	工事名	工期	施工会社
工事場所①	横浜港南本牧地区荷さばき地整備工事	H31.3.11 ~ R2.3.23	若築建設株式会社 横浜支店
	MC3・MC4につながる道路とコンテナトレーラーの入出場管理ゲートを作ります。		
工事場所②	横浜港南本牧地区荷さばき地舗装等工事	H31.3.13 ~ R2.2.28	株式会社 NIPPO 関東第一支店
	MC3・MC4につながる道路を作ります。		
工事場所③	横浜港南本牧地区荷さばき地整備工事	H31.4.18 ~ R2.3.23	若築建設株式会社 横浜支店
	MC3・MC4につながる道路とコンテナトレーラーが入ってくる門扉を作ります。		



横浜港南本牧ふ頭地区国際海上コンテナターミナル整備事業



		年度									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	
MC4	岸壁(水深18m)(耐震)										
	荷捌き地									本工事	
	航路・泊地、泊地(水深18m)										
	荷役機械・上屋等(事業区分:貸付)										



横浜市港湾局提供

京浜港湾事務所

工事内容

工事場所①

- 盛土工
- 基礎杭
- 排水構造物工
- 配電線設備工
- ゲート部掘削
- ゲート建設
- 舗装

5月は、入出場管理ゲートと道路部に土を運んで土地造成を行いました。
6月中旬より、入出場管理ゲートの基礎杭の施工を行います。



基礎杭造成プラント設置



基礎杭造成機械

工事内容

工事場所②

- 盛土工
- 排水構造物工
- 路床改良工
- 配電線設備工
- 門扉工
- AS舗装工
- 防止柵工



路床盛土 作業開始前
令和元年5月上旬



路床盛土工事
令和元年5月下旬



路床盛土工事を行っています。引き続き、路床盛土工事・雨水排水工事・配電線設備工事を行います。

工事内容

工事場所③



路床盛土 令和元年6月

担当技術者紹介



担当技術者
若築建設株式会社
阿部 聡さん (27)

入社3年目です。
この現場は、他工事と隣接した区域での施工になるため、特に施工境界や資材搬入路での安全管理が重要な工事と認識しています。
基本を大事にした安全管理を心掛けて、職員と作業員が互いに協力して安全作業を進めていきます。

