



京浜港湾事務所

工事名 横浜港南本牧地区コンテナヤード整備工事
工期 平成31年 4月18日 ~ 令和 2年 3月23日
施工会社 若築・りんかい日産特定建設工事共同企業体
工事内容 MC4のコンテナヤードを整備するため、土工や舗装工、排水構造物工、配電線設備工等を施工します。

●本工事の施工記録



路盤転圧状況



電気管路敷設完了



FRPM管敷設完了



PPC版据付状況

●進捗状況・お知らせ

蔵置部においては、路盤工、排水構造物工、配電線設備工の施工が概ね完了し、10月中旬からPPC版の据付を開始しました。

PPC版は1月中旬までに、全部で1284枚の据付を行う予定です。

また、PPC版の据付が完了した部分から、アスファルト舗装の施工を進めていきます。

空コンテナ置き場部においては、引き続き、排水構造物工、配電線設備工の施工を進めていきます。



横浜港南本牧ふ頭地区国際海上コンテナターミナル整備事業




		年度						
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
MC4	岸壁(水深18m)(耐震)							
	荷捌き地							
	航路・泊地、泊地(水深18m)							
集中管理ゲート	荷捌き地							



横浜市港湾局提供

横浜港南本牧地区コンテナヤード整備工事

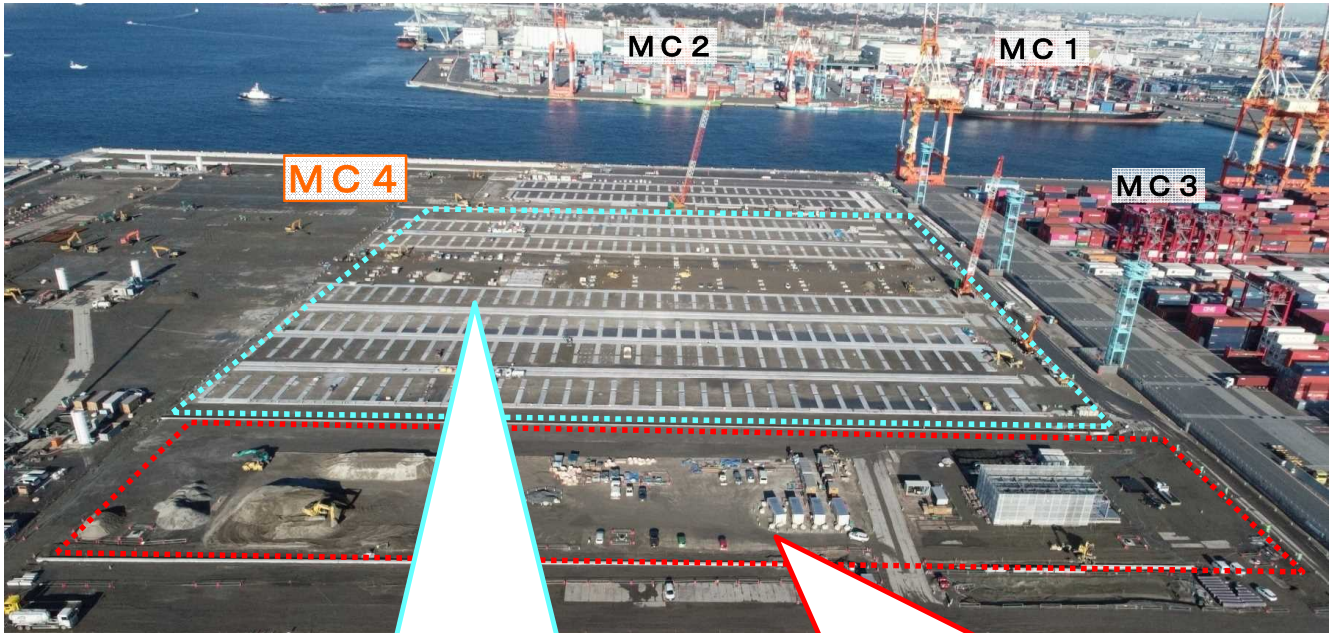

【蔵置部】

路床改良工事、排水設備の整備、配電線設備の配管が終わったので、現在はコンクリート版の配置作業をしています。

コンクリート版はとても重く、最大で1枚22トンもあります。また、全部で1284枚も配置します。

コンクリート版の配置が終わったら、版と版の間にアスファルト舗装を行います。

将来は、コンテナが置かれるスペースになります。



【空コンテナ置き場部】

10月に路床盛土の施工が完了しました。

現在は排水設備の整備、配電線設備の配管を行っています。

今後は、アスファルト舗装を行います。

将来は、空コンテナが置かれるスペースになります。



匠技術者紹介



もともつ ひろし
本松 弘

年齢… 62歳
所属会社… 若築建設株式会社
出身地… 福岡県北九州市
趣味… ポート釣り専門
仕事で大切にしていること…
皆さん仲良く元気に！



よしずみ ひろかず
吉住 博和

年齢… 66歳
所属会社…
りんかい日産建設株式会社
出身地… 神奈川県川崎市
趣味… スキューバ・登山
仕事で大切にしていること…
楽しむこと！
