


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP2)橋梁下部工事
 工 期 平成27年3月4日～平成29年3月17日
 施工会社 五洋・清水特定建設工事共同企業体
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、作業ヤード整備(陸上)や作業用仮設栈台設置(海上)作業、基礎構築及び橋脚構築(海上)作業を行います。

工事箇所の詳細図

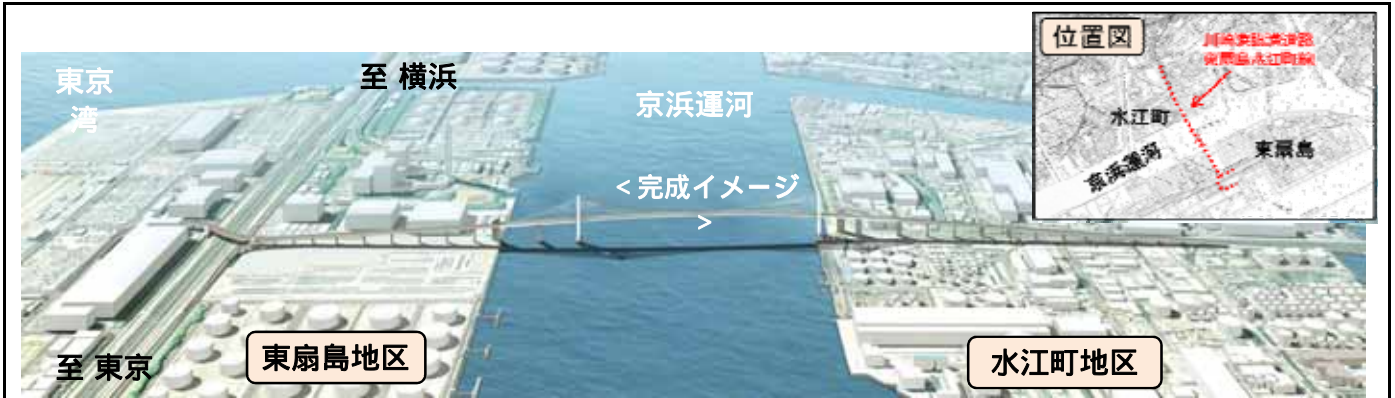

施工箇所平面図

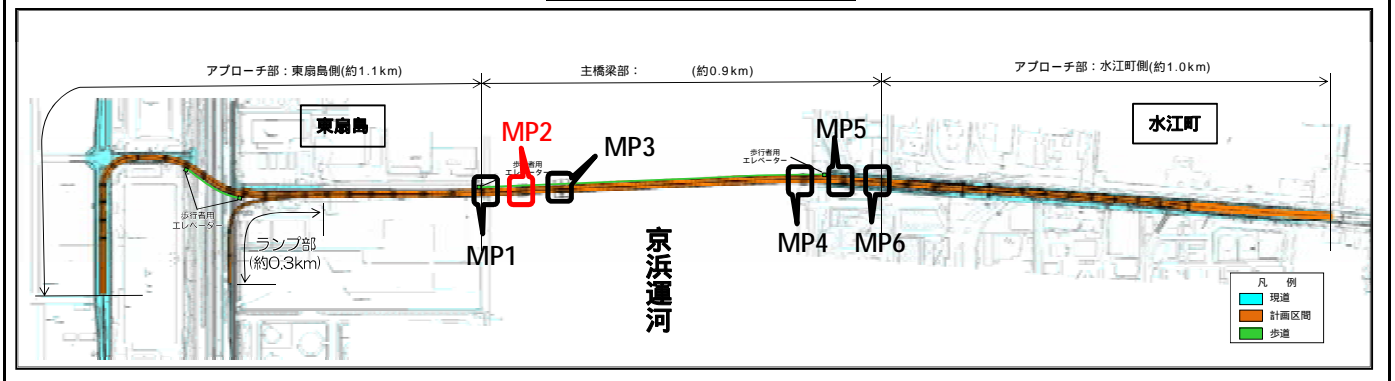

12月の工事予定

| 内容 | 平成28年12月 | | | | | | 備考 |
|---------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 基礎・橋脚工 | | | | | | | |
| 継手処理 | ————— | | | | | | |
| 導杭、導枠撤去 | ————— | | | | | | |
| 鋼管矢板(隔壁)切断・撤去 | ————— | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は8時から17時、海上作業は日の出から日没となります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 12月の作業内容

写真

基礎・橋脚工
(鋼管矢板継手処理)



鋼管矢板間の継手にモルタルを注入し、鋼管矢板井筒内を密閉構造にします。

モルタル注入箇所
(連結部分)



写真

基礎・橋脚工
(中間杭打設)



鋼管矢板井筒内を外からの水圧に耐えられる構造とするため、支保工を設置します。写真は支保工設置に先立ち、中間杭の打設を行っている状況です。
