


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP3)橋梁下部工事  
 工 期 平成30年4月1日～平成32年1月31日  
 施工会社 東亜・若築・みらい特定建設工事共同企業体  
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、基礎構築及び橋脚構築（井筒内）作業を行っています。

工事箇所の詳細図

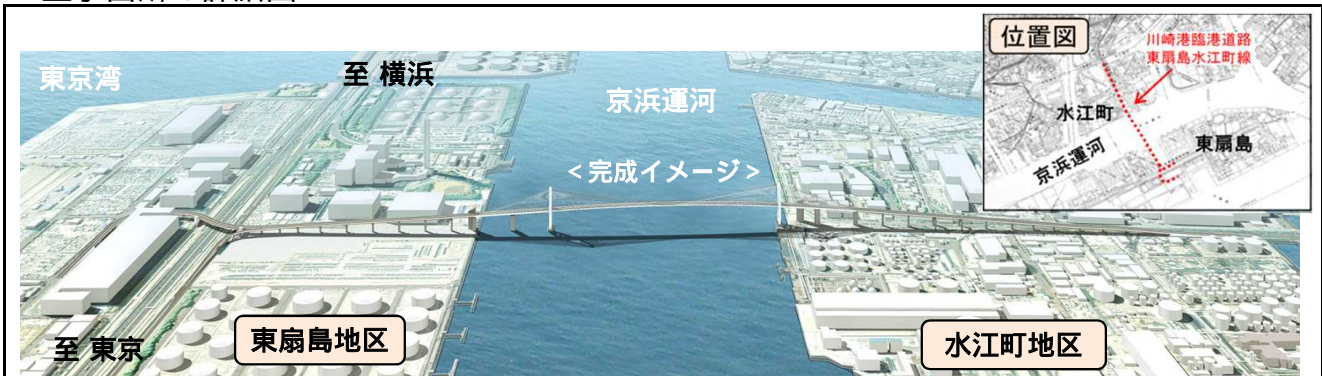

施工箇所平面図

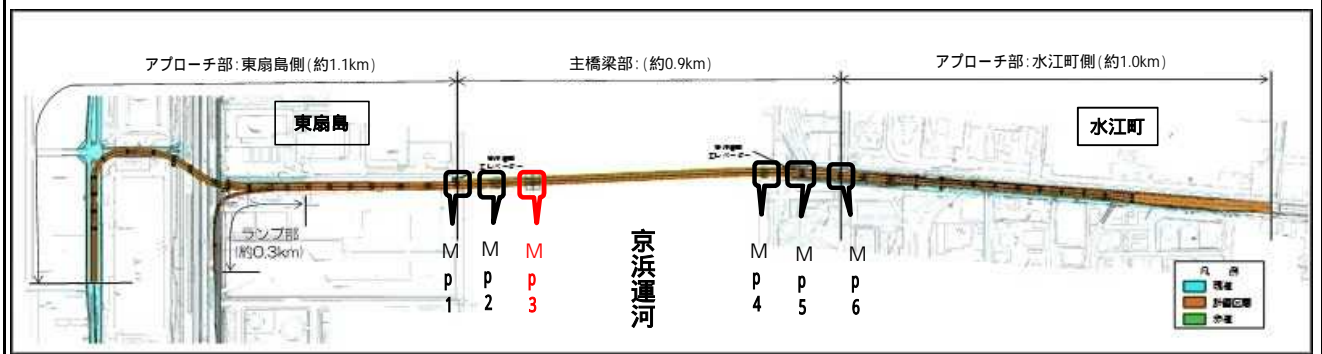

9月の工事予定

内容	平成30年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
基礎・橋脚工							
頂版コンクリート							

お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は8時から17時、海上作業は日の出から日没となります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 7～8月の作業内容

写真



鋼管矢板と頂版  
コンクリートを結  
合するため、ス  
タッド鉄筋を鋼管  
矢板に溶接して  
います。

頂版コンクリート打設深度  
-19.475m ~ -26.975m

写真



鋼管杭と頂版コ  
ンクリートを一体  
化するため、鋼  
管杭の内面にず  
れ止めを溶接し  
ています。
