



京浜港湾事務所

工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP5,6)橋梁下部工事

工期 平成31年4月18日 ～ 令和2年3月23日

施工会社 清水建設株式会社

工事内容 本工事では平成30年度工事の継続工事で2基の橋梁下部工を構築します。

進捗状況・お知らせ


作業時間は、原則として昼間8時から17時としています。
6月中旬頃よりMP5・MP6の橋脚基礎スラブの鉄筋組立を行っていきます。



川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業




年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
測量・調査・設計(施工検討含む)															
用地取得調整・工作物移設															
関係者調整等(近接施工・上部工施工)															
施工															

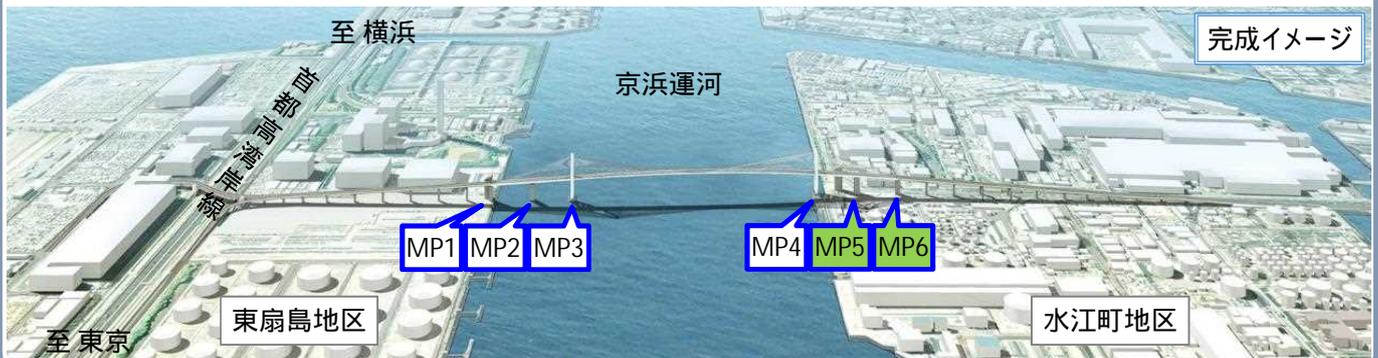

川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP5,6)橋梁下部工事

工事場所

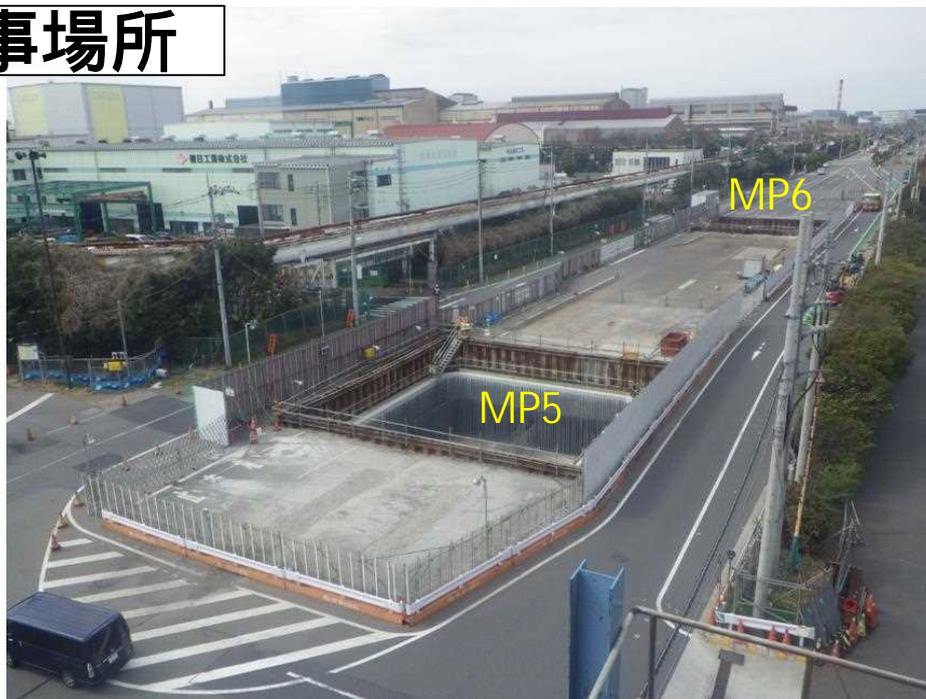

MP5・MP6ともに橋脚基礎部はコンクリートを14層に分けて施工する計画で、前回工事で13層までコンクリート打設が終了しています。
本工事では、橋脚基礎部の最終層である14層目の基礎スラブの構築を6月中旬頃より行い、順次橋脚部分の施工に移っていきます。

基礎スラブとは・・・

上部構造(橋脚部)の荷重を支え、荷重を地盤に伝える部分です。

