川崎港東扇島〜水江町地区臨港道路整備事業 工事レポート 令和4年6月



京浜港湾事務所

工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事 (その4)

工 期 令和元年10月25日 ~ 令和5年3月15日

施工会社 鹿島・東亜特定建設工事共同企業体

工事内容 本工事は、京浜運河をまたぐ斜張橋のうち、水江町側の MP4橋脚~MP6橋脚間(施工延長170m)の2径間連続PC箱桁

を片持ち張出し架設工法により施工します。

また、今後のアプローチ部工事に必要となる道路改良工事 をおこないます。

●本工事の施工記録




上部工事 MP5 · 6橋脚状況

上部工事 MP5柱頭部・MP6脚頭部工 令和4年5月



●進捗状況・お知らせ

現在の進捗は、橋梁工事についてはMP5柱頭部(橋脚上の橋桁部分)の施工をはじめました。またMP6脚頭部 (橋脚の上の部分)の施工は順調に進捗しています。

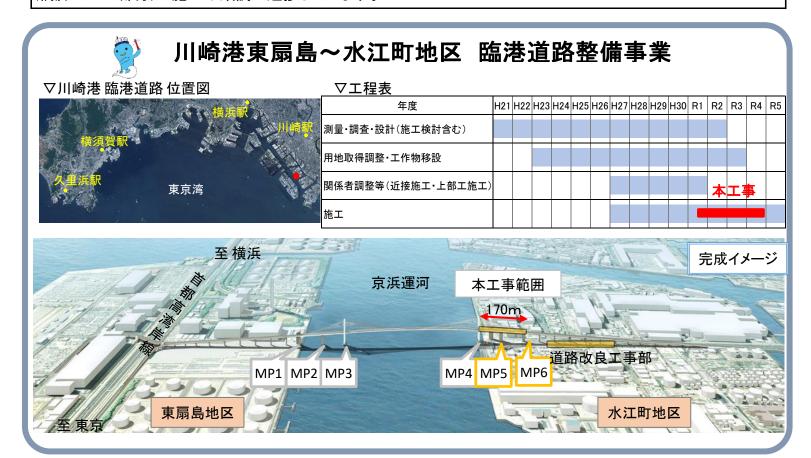

川崎港東扇島~水江町地区臨港道路整備事業 工事レポート 令和4年6月

京浜港湾事務所

