



京浜港湾事務所

工事名 令和5年度川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

工期 令和5年10月13日～令和8年5月29日

施工会社 三井住友・みらい 特定建設工事共同企業体

工事内容 本工事は、川崎港臨港道路東扇島水江町線整備における水江町アプローチ部の構造物撤去工、切回し道路工、排水構造物工、擁壁工、橋台工、RC 橋脚工、防護工、付帯設備工、仮設工を施工します。

●本工事の施工記録



準備工
(測量工)
令和6年3月



切り回し道路工
(道路舗装工)
令和6年6月



排水構造物工
(地下水位低下工法・掘削工)
令和6年6月

●進捗状況・お知らせ

本工事は川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁へ接続するアプローチ部橋梁下部工を建設するもので、現在の工事は本工事を行うために現在の道路の切り直し工事を行っているところです。



川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業


▽川崎港 臨港道路 位置図



▽工程表

年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
測量・調査・設計(施工検討含む)																			
用地取得調整・工作物移設																			
関係者調整等(近接施工・上部工施工)																			
施工(工場製作、主塔架設、桁架設)																			

完成イメージ 至 横浜

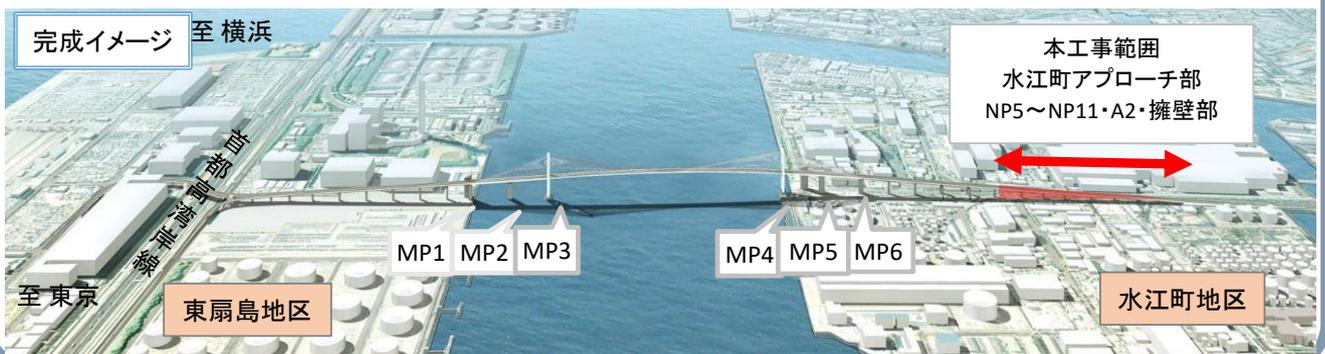

本工事範囲
水江町アプローチ部
NP5～NP11・A2・擁壁部

至 東京

東扇島地区

水江町地区

令和5年度川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

(凡例)
(赤:施工済、青:施工中、白:今後施工)



準備工:(植樹帯撤去)



道路を切り回すために現在の道路植栽帯の撤去を行っているところだよ。




排水構造物工:(地下水位低下工法)



道路の排水施設や舗装工事のため地下水位を下けているところだよ。

地下水低下工法とは?
地下水位の位置までパイプを挿して水を吸い上げ、地下水位を下げる工法です。

模式図



切り回し道路工:(歩道切削・道路舗装)



掘削状況



アプローチ部橋脚施工のために道路を拡幅しているところだよ。

アスファルト舗装状況
