



京浜港湾事務所

工事名 令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町
アプローチ部橋梁下部工事

工期 令和5年10月13日～令和8年11月30日

施工会社 三井住友・みらい 特定建設工事共同企業体

工事内容 本工事は、川崎港臨港道路東扇島水江町線整備における水江町アプローチ部の構造物撤去工、切回し道路工、排水構造物工、擁壁工、橋台工、RC 橋脚工、防護工、付帯設備工、仮設工を施工します。

●本工事の施工記録



切り回し道路工
(道路舗装工)



現場状況
上：京浜運河方面
下：川崎駅方面



既製杭工
(RC橋脚工)

●進捗状況・お知らせ

本工事は川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁へ接続するアプローチ部橋梁下部工を建設するもので、現在の工事は橋台と擁壁の構築を進めています。




川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業


▽川崎港 臨港道路位置図



▽航空写真



完成イメージ 至横浜

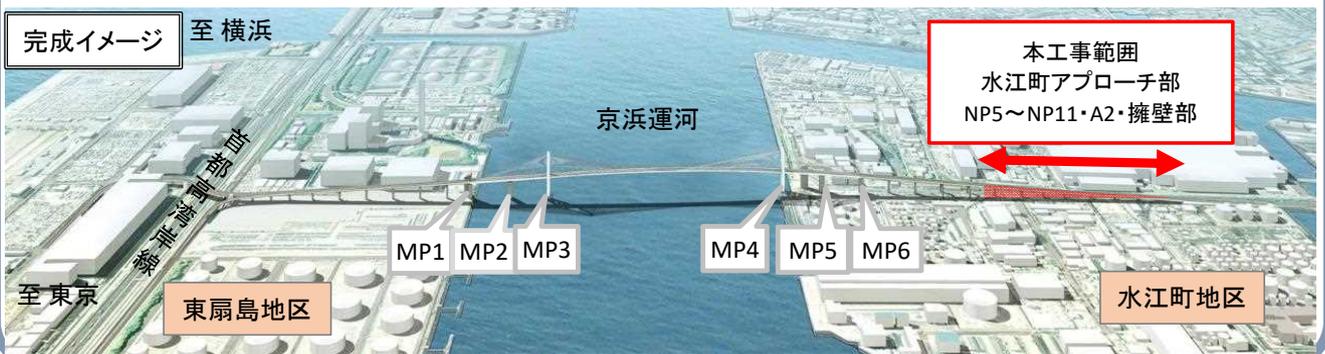

至東京

東扇島地区

MP1 MP2 MP3

MP4 MP5 MP6

京浜運河

本工事範囲
水江町アプローチ部
NP5～NP11・A2・擁壁部

水江町地区

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町 アプローチ部橋梁下部工事
(凡例)(赤:施工済、青:施工中、白:今後施工)



橋台工では、橋梁を支える重要な構造物である橋台を構築します。まず、基礎となる均しコンクリートを打設し、施工面を整えます。その後、橋台躯体の鉄筋を組み立て、型枠を設置してコンクリートを打設することで、橋台本体を構築します。

橋台工

●鉄筋組立完了



●コンクリート打設状況



●橋台全景状況

現況写真(令和7年9月)







擁壁工



底版鉄筋組立状況



均しコンクリート打設状況



掘削状況

擁壁工においては、均しコンクリートおよび杭頭鉄筋の組立を進めています。その後の工程として、底版の鉄筋・型枠組立およびコンクリート工事を順次進めていきます。

RC橋脚工



鋼管杭打設状況

RC橋脚工では、NP5～NP8の鋼管杭打設が完了しました。今後はNP9～NP11の鋼管杭打設に着手する予定です。

