

横浜臨港道路南本牧ふ頭・本牧線

工事名 南本牧ふ頭・本牧線地盤改良等工事

工期 平成22年5月28日～平成23年2月25日

施工会社 日本海工株式会社

工事内容 臨港道路南本牧ふ頭側盛土部直下の地盤を改良するものです。併せて工事により通行が出来なくなる道路を切り回します。


●工事箇所の詳細図

今月は、地盤改良工事として、交差噴流式複合攪拌工法（JACSMAN工法）を実施します。

必要理由

橋梁への接続となる盛土部分について、液状化により通行が出来なくなることを防ぐため、地盤を改良するものです。今回の工法は土壌にセメントミルクを攪拌噴射することで、格子状に杭を形成し、液状化を防止するものです。

JACSMANの作業フロー

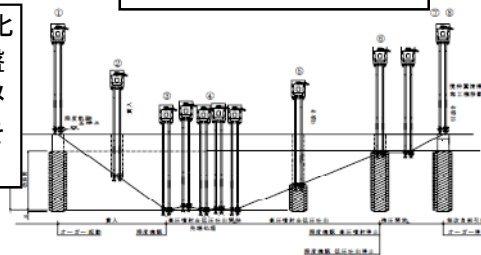


施工位置

作業状況写真

施工平面図

地盤改良施工

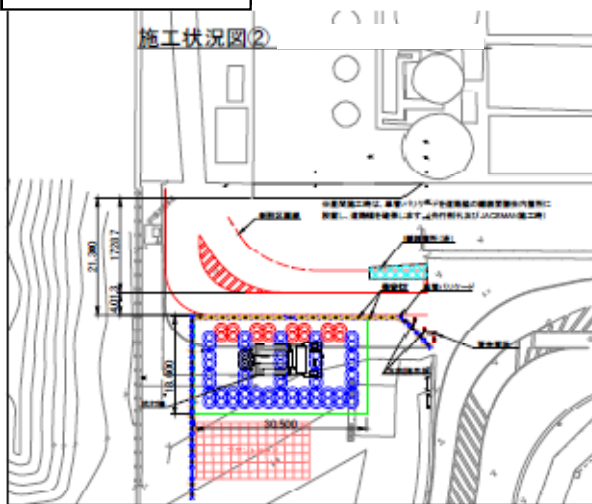

●今月の工事予定

内容	平成22年12月						備考
	5	10	15	20	25	30	
地盤改良工							
プラント組立	■						
JACSMAN工法			■				
噴き上がり土砂運搬			■				
昼間作業(7:00~18:00)							

●お知らせ

作業時間は、月～金曜日 昼間:7時から18時となります。
 第2ブロックへの進入路が変更となっています。また、道路際の施工時には車幅を狭めますので、利用者の皆様には、大変ご不便をお掛けしますが、工事のご理解とご協力の程よろしく申し上げます。
