


京浜港湾事務所

工事名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅰ・Ⅱ工区）高架橋下部工事
 工期 平成26年4月17日～平成27年1月9日
 施工会社 奈良建設株式会社
 工事内容 本工事は、横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備事業におけるⅠ・Ⅱ工区高架橋下部工事において、橋台1基・橋脚4基を施工するものです。

●工事箇所の詳細図

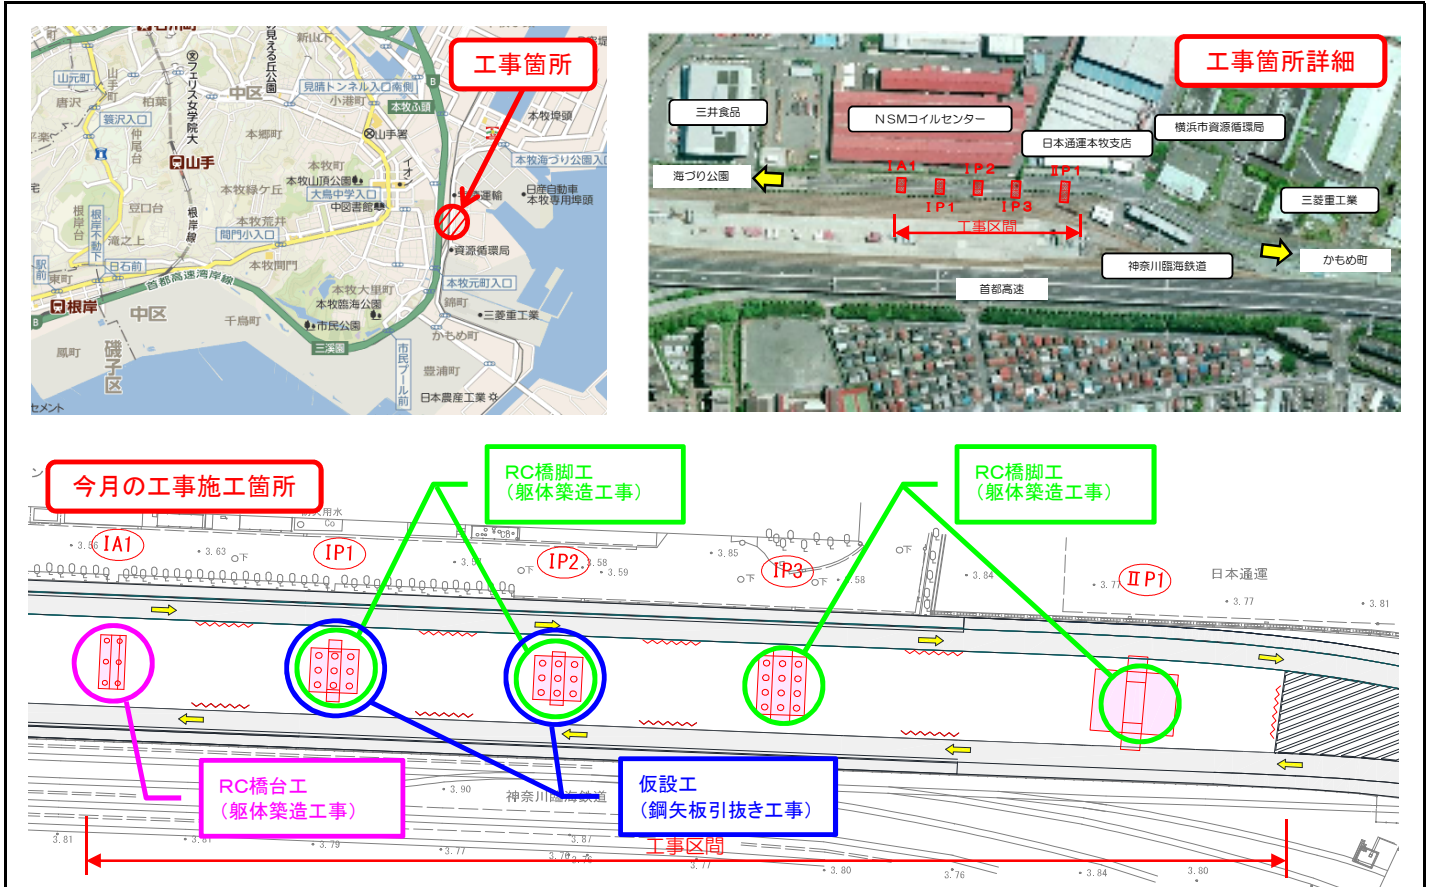

●今月の工事予定

内容	平成26年10月						備考
	5	10	15	20	25	31	
準備工							
鋼管杭基礎工							
RC橋台工	[Shaded]						
RC橋脚工	[Shaded]						
仮設工				[Shaded]			
構造物撤去工							
片付け工							

※ 施工箇所の枠囲み色に対応しています。

●お知らせ

作業時間は、原則として月～土曜日の8:00～17:00となります。(作業の都合上、若干変更する場合がございます。)10月中の交通規制は御座いませんが、11月中旬に市道部分に鋼製の支保工を設置します。これに伴い、上下線の市道部分が高さ制限4.7m以下となりますので、ご通行の際はご注意ください。また、躯体築造工事に伴い、頻りに市道部へ生コン車や資材運搬車両等の工事車両が出入りします。近隣の皆様には大変ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

写真① 今月の作業内容

写真①



写真①
鉄筋・型枠・足場組立状況
足場を設置し、橋脚本体の鉄筋
や型枠の組立を行います。

写真②



写真②
コンクリート打設状況
コンクリート圧送車により躯体コ
ンクリートの打設を行います。
全体で17回の打設を計画してお
り、今月までに計13回打設予定
です。
