




京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（ - 2 工区 ）高架橋基礎工事
 工 期 平成25年6月27日～平成26年2月28日
 施工会社 奈良建設株式会社
 工事内容 本工事は、横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備事業における - 2 工区高架橋基礎工事において、深礎杭 2 箇所を施工するものです。

工事箇所の詳細図

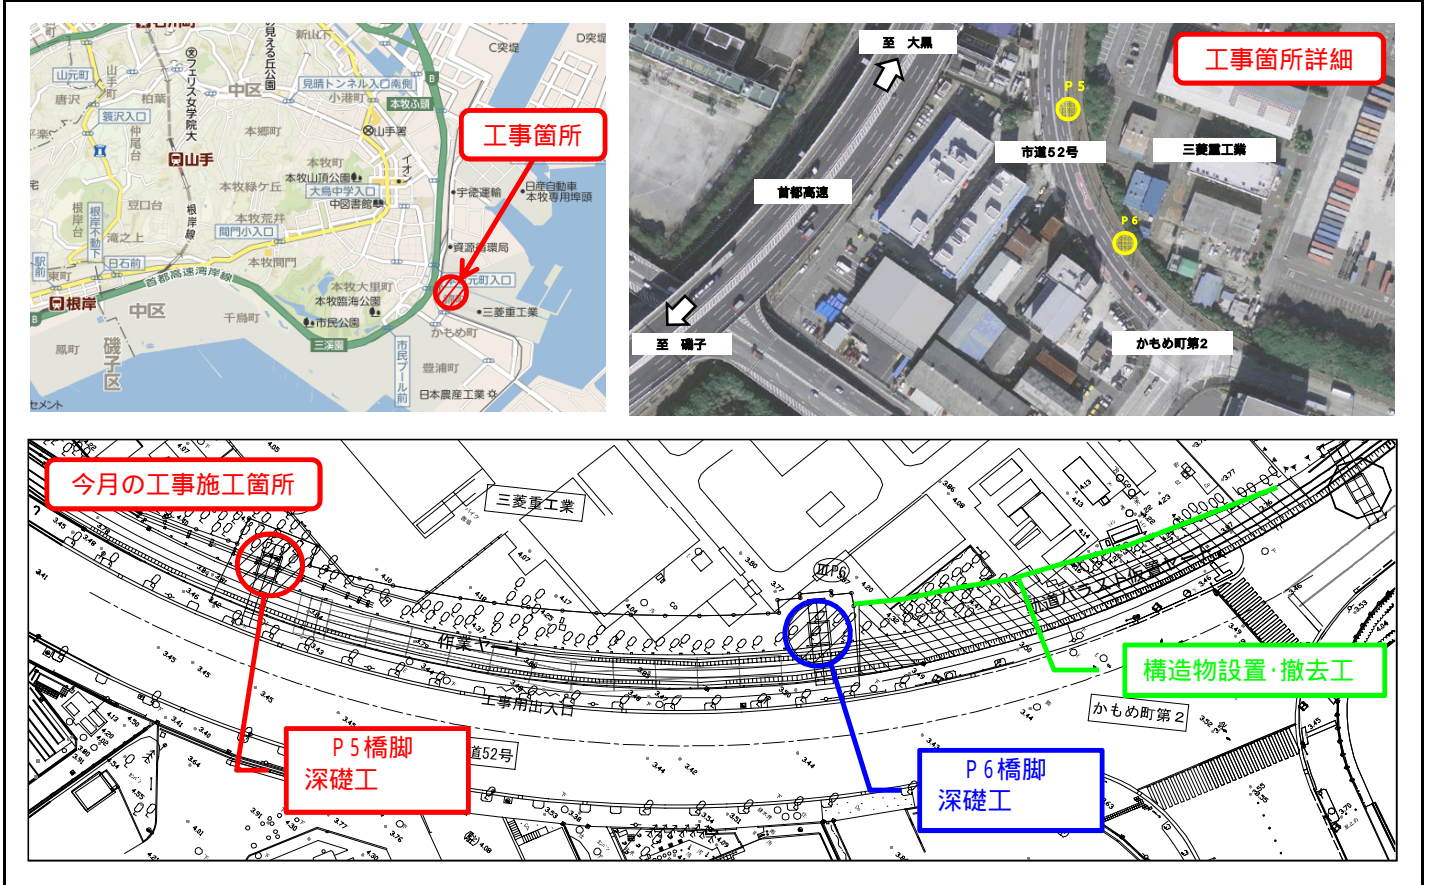

今月の工事予定

内容	平成25年12月						備考
	5	10	15	20	25	30	
深礎工 P.5 橋脚							
掘削・ライナープレート土留め							
鉄筋加工							
深礎工 P.6 橋脚							
掘削・ライナープレート土留め							
構造物設置・撤去工							
組立塀設置・撤去							

施工箇所の枠囲み色に対応しています。

お知らせ

作業時間は、原則として月～土曜日の8:00～17:00となります。(作業の都合上、若干変更する場合がございます。)交通規制は御座いませんが、掘削土砂を搬出するため、頻繁に市道部へダンプトラックが出入りします。近隣の皆様には大変ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

写真 今月の作業内容

写真



写真
深礎杭施工状況

柱の基礎となる杭部分を掘削するため施工精度の向上を目的として外周にコンクリートを打設しています。

写真



写真
深礎杭施工状況

クラムシェルという機械を使用して杭部分を掘削しています。本工事の掘削深さは13.5mですが、この機械は約20mの深さまで掘削できます。
