

京浜港湾事務所



工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線 (IV工区) 高架橋下部工事  
 工 期 平成25年6月5日～平成26年11月7日  
 施工会社 東亜・三菱・宮地異工種建設工事共同企業体  
 工事内容 本工事は、横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備におけるIV工区高架橋下部工事において、鋼製橋脚7基を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図



●全体の工事予定

内 容	平成26年6月						備 考
	5	10	15	20	25	30	
鋼製橋脚工							
工場製作工	■	■	■	■	■	■	
深礎工	■	■	■	■	■	■	
橋脚架設工		■	■	■	■	■	アンカーボルト設置作業
路面覆工		■		■		■	一部撤去・掛替え作業
	■	■	■	■	■	■	道路車線規制


●お知らせ

6月は各橋脚部において鋼製橋脚の基礎となる深礎工の掘削が完了し、コンクリートの打設をⅢP7、IVP1橋脚部で予定しております(IVP3、IVP4は第1回目のコンクリート打設完了)。  
 また、6月上旬からIVP4、IVP3、IVP1橋脚部において、鋼製橋脚架設のためのアンカーボルトの設置作業を予定しております。それに伴い、路面覆工の一部撤去・掛替え作業を予定しており、その後の道路幅員は2.5車線となります。  
 近隣の皆様には、大変ご不便をおかけいたしますが、工事のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

写真 今月の作業内容

写真①

IVP1 橋脚 (外側)

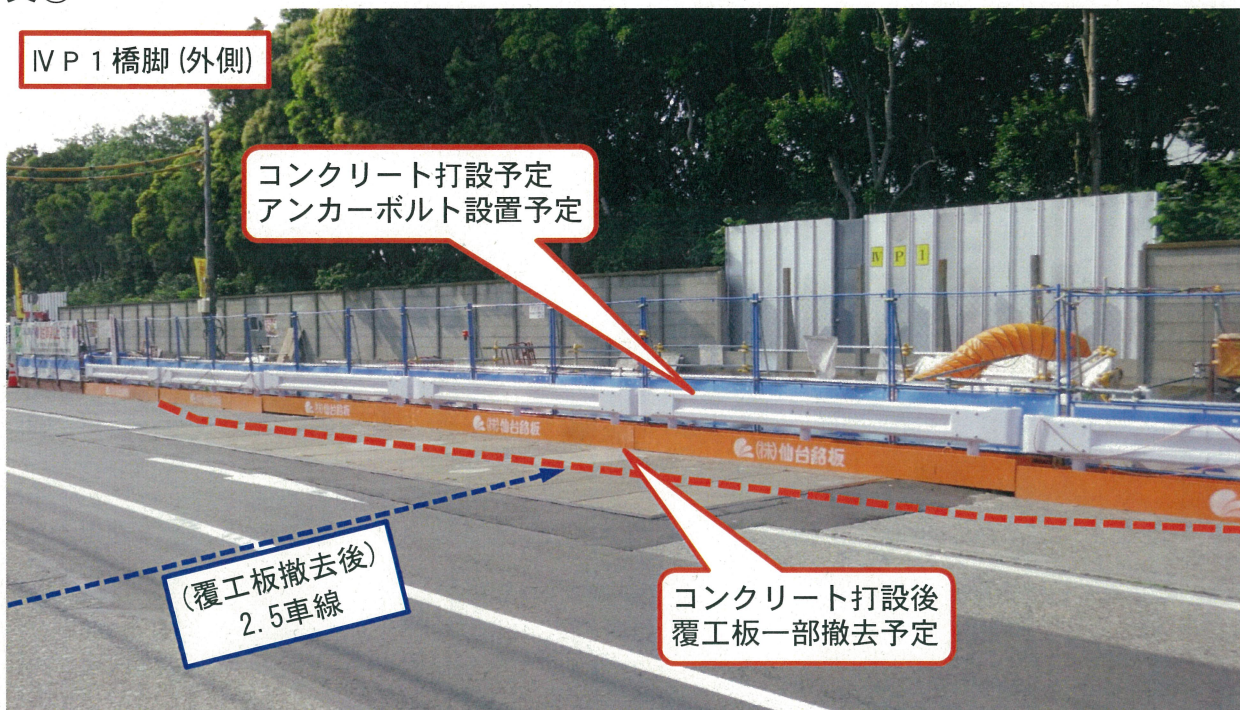

写真②

IVP1 橋脚 (内側)

