



京浜港湾事務所

工 事 名 平成25年度横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線 (VI工区) 橋梁下部工事  
 工 期 平成25年6月21日 ~ 平成27年1月23日  
 施工会社 東洋・オリエンタル白石特定建設工事共同企業体  
 工事内容 横浜港臨港道路の整備事業として、ニューマチックケーソン工法で橋脚2基を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図



●今月の工事予定

内容	平成26年 6月						備考
	5	10	15	20	25	30	
ニューマチックケーソン基礎工							
ケーソン設備	■						
沈下掘削					■		P3ケーソン
橋脚工							
橋脚構築	■						P2・P3橋脚

●お知らせ

橋脚工 (P2・P3) は初期構築 (7ロット) を完了し、ニューマチックケーソン基礎工 (P3) の沈下掘削を6月中旬より開始します。P2の沈下掘削は7月上旬より開始予定です。



今月の作業内容



橋脚工 P2・P3橋脚構築は初期構築(7ロット)完了



ケーソン設備 共通設備設置完了

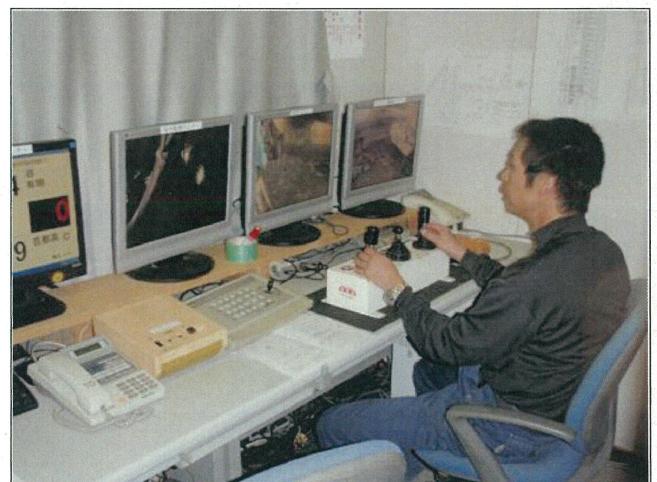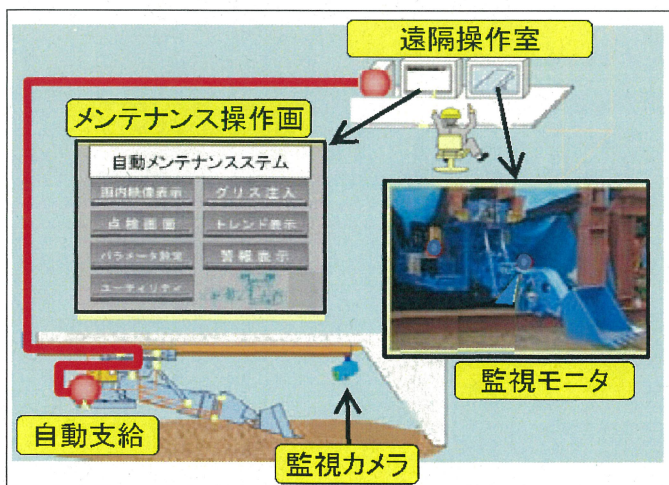

沈下掘削 遠隔無人機械掘削状況
