川崎港東扇島～水江町地区臨港道路整備事業 工事レポート　令和8年 8月



京浜港湾事務所

工 事 名　川崎港臨港道路東扇島水江町線
水江町アプローチ部橋梁下部工事

工　　期　令和5年10月13日～令和8年11月30日

施工会社　三井住友・みらい　特定建設工事共同企業体

工事内容　本工事は、川崎港臨港道路東扇島水江町線整備における水江町アプローチ部の既設構造物撤去工、切回し道路工、排水構造物工、擁壁工、橋台工、RC 橋脚工、防護工、付帯設備工、仮設工を施工します。

●本工事の施工記録



NP6～11橋脚工、A2橋台工、擁壁工完了



切り回し道路工　水江町線2車線開放



RC橋脚工　NP5～11全景
令和8年8月現在


●進捗状況・お知らせ

本工事は川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁へ接続するアプローチ部橋梁下部工を建設するもので、現在の工事は橋脚と擁壁、市道整備工事を進めています。




川崎港東扇島～水江町地区　臨港道路整備事業

▽川崎港 臨港道路 位置図



▽工程表

年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
測量・調査・設計（施工検討含む）																			
用地取得調整・工作物移設																			
関係者調整等（近接施工・上部工施工）																本工事			
施工（工場製作、主塔架設、桁架設）																			

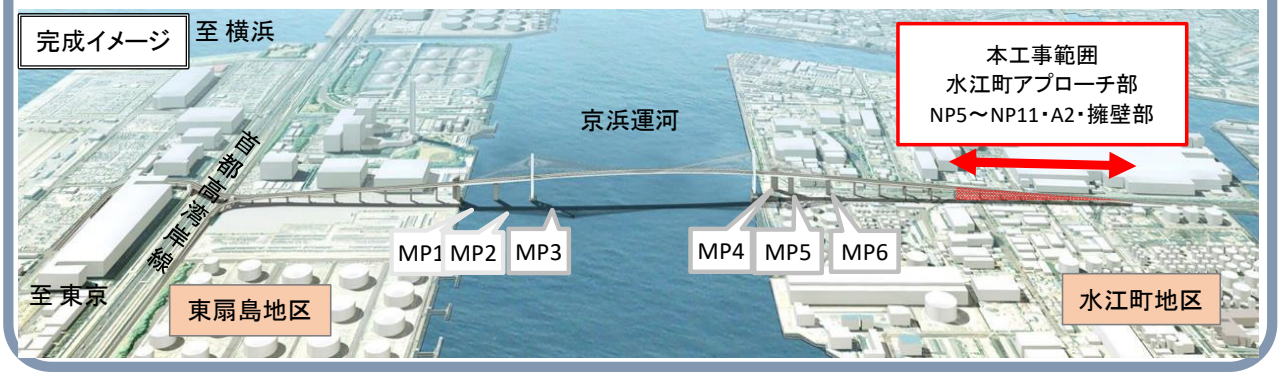

川崎港東扇島～水江町地区臨港道路整備事業 工事レポート　令和8年 8月

京浜港湾事務所

川崎港臨港道路東扇島水江町線　　**水江町アプローチ部橋梁下部工事**

（凡例）（赤：施工済、青：施工中、白：今後施工）

施工状況：準備工 → 構造物撤去工 → 排水構造物工 → 防護工 → 切り回し道路工 → 橋台工 → 擁壁工 → RC橋脚工 → 切り回し道路工



RC橋脚工は基礎工事のあと、底版、柱、梁の順に躯体構築を行っていきます。現在は梁部の施工を行っており、道路上に面した場所は柱部に設置したブラケット支保工を土台としてその上に足場、型枠支保工を組立て、コンクリートを打設します。橋脚側面の交通を維持しながら、安全に配慮し施工を行っていきます

RC橋脚工

●鋼管杭工



●鋼矢板



●山留工



●掘削工



●鉄筋工



●底版コンクリート



●柱　鉄筋・型枠工



●柱コンクリート工



●梁コンクリート工



●NP6~11　RC橋脚完成



●切り回し道路工



●NP5梁　鉄筋・型枠工



現況写真(令和8年8月)

擁壁工



PCa壁高欄設置



擁壁工完成

擁壁工はプレキャスト製壁高欄を設置し、場内側の盛土と舗装も完成しました。

橋台工



A2橋台　擁壁工　完成

橋台工と擁壁工は完成しました。
