川崎港東扇島～水江町地区臨港道路整備事業　工事レポート　令和8年8月



京浜港湾事務所

工 事 名　**令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事**

工　　期　令和5年12月13日　～　令和9年7月30日

施工会社　ＭＭＢ・宮地・川田 特定建設工事共同企業体

工事内容　本工事は、京浜運河をまたぐ斜張橋のうち、水江町側のＭＰ４主塔(上段ブロック)の地組、架設および中央径間の鋼橋の工場製作、地組、架設と橋梁付属物工等の施工を行う工事です。

●本工事の施工記録



工場製作
鋼桁仮組立状況
令和8年1月



工場製作
鋼桁塗装状況
令和8年3月



現地工事
MP4全景
令和8年5月

●進捗状況・お知らせ

工場製作は、3つの工場で鋼桁の仮組立や塗装・溶接作業を行っています。現地工事は、接合桁と主塔上段ブロックの架設が完了し、鋼桁架設の準備を進めています。引き続き安全を第一に工事を進めておりますので宜しくお願いいたします。




川崎港東扇島～水江町地区　臨港道路整備事業

▽川崎港 臨港道路 位置図



▽工程表

年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
測量･調査･設計(施工検討含む)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
用地取得調整･工作物移設			■	■	■	■	■	■	■	■	■									
関係者調整等(近接施工･上部工施工)							■	■	■	■	■					本工事				
施工(工場製作、主塔架設、桁架設)							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

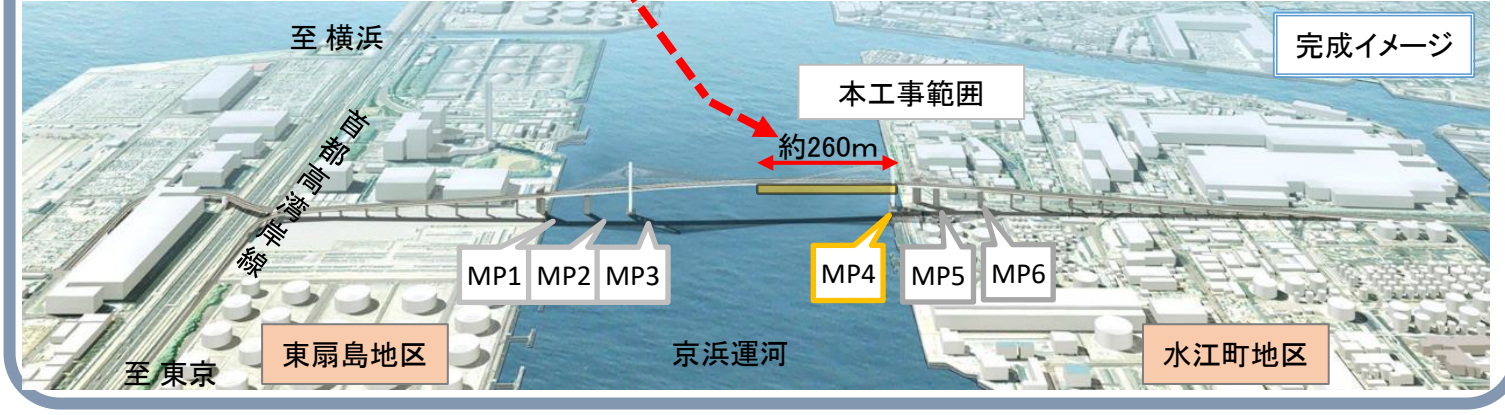

川崎港東扇島～水江町地区臨港道路整備事業　工事レポート　令和8年8月


京浜港湾事務所

令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事

MP4主塔の接合桁架設～上段ブロック架設

施工状況　接合桁 現場搬入～架設　接合桁 位置調整　上段ブロック 建起こし～架設

接合桁：現場搬入

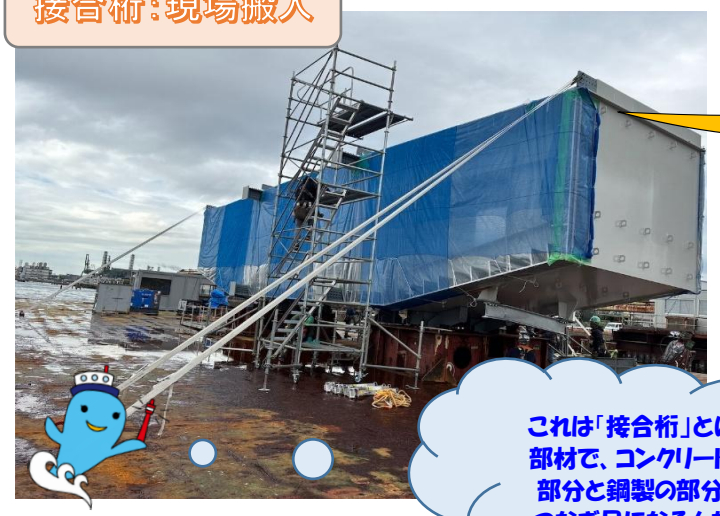

これは「接合桁」という部材で、コンクリートの部分と鋼製の部分のつなぎ目になるんだ。

接合桁：架設



主塔上段ブロック：現場搬入



接合桁：位置調整



主塔上段ブロック：建起こ



重さが約1,500トンもある上段ブロックを90°建起こし！慎重に作業するよ！

主塔上段ブロック：架設完了



高さ95.5mの主塔が完了です！
