川崎港東扇島～水江町地区臨港道路整備事業 工事レポート　令和 8年 8月



京浜港湾事務所

工 事 名　令和6年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部側径間上部工事

工　　期　令和6年9月2日　～　令和8年5月29日

施工会社　三井住友・みらい・日本ピーエス特定建設工事共同企業体

工事内容　本工事は、京浜運河をまたぐ斜張橋のうち、東扇島側のMP1橋脚～MP3橋脚間（延長170m）のMP1柱頭部、MP3柱頭部、閉合部、接合部、仮斜材張力調整、架設外ケーブル、橋梁付属物工を施工します。

●本工事の施工記録



MP3接合部施工
令和7年10月



桁下レールブラケット施工
令和8年2月



竣工時
令和8年5月


●進捗状況・お知らせ

本工事は上部工事（その3）（張出架設（15BL/15BL））終了後の、MP1柱頭部・MP3柱頭部・仮斜材張力調整工・架設外ケーブル工・橋梁付属物工を行う工事です。令和8年5月29日に竣工いたしました。




川崎港東扇島～水江町地区　臨港道路整備事業

▽川崎港 臨港道路 位置図

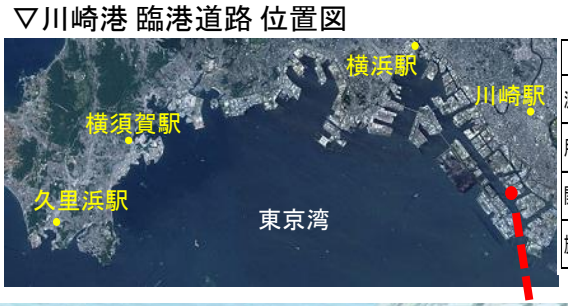

▽工程表

年　度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
測量・調査・設計（施工検討含む）																			
用地取得調整・工作物移設																			
関係者調整等（近接施工・上部工施工）																本工事			
施工（工場製作・主塔架設・桁架設																			

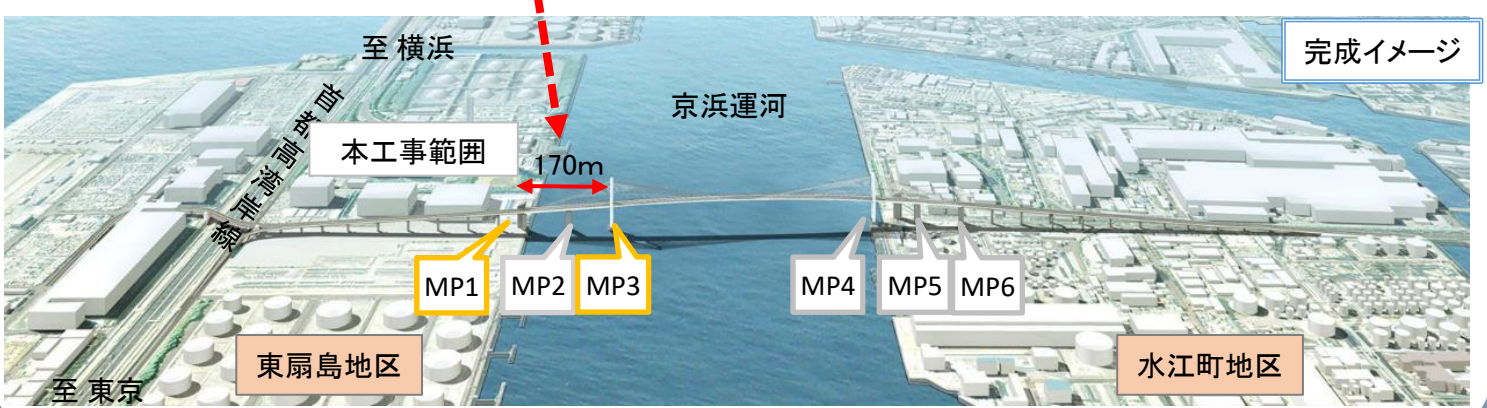

川崎港東扇島～水江町地区臨港道路整備事業 工事レポート　令和 8年 8月

京浜港湾事務所


令和6年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部側径間上部工事

施工フロー


型枠組立 → 鉄筋・PC組立 → コンクリート打設 → PC緊張 → 閉合BL施工 → 張力調整 → 接合部 → 外ケーブル施工

MP1・MP3柱頭部施工

接合部施工

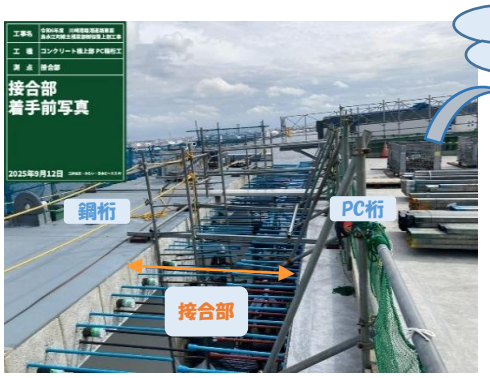

狭い箇所で鉄筋・PCを組み立てるのは大変だった、、、

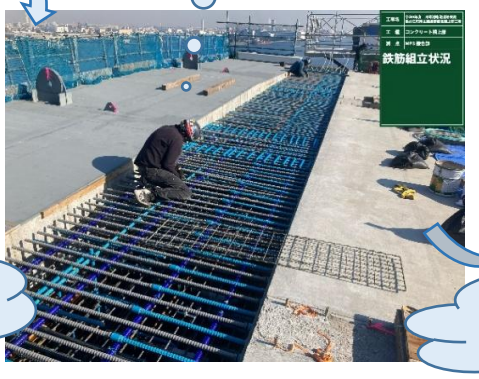



鋼桁とPC桁の間(接合部)の施工状況だよ。

鋼桁とPC桁を連結させるためにたくさんPCケーブルを緊張するよ。

外ケーブル施工







橋梁付属物工施工





現場全景



完成
ご協力、ありがとうございました！
