

## 令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【関東地方整備局】

| 契約変更年月日   | 工事の名称                       | 変更前の契約金額 | 変更後の契約金額※ | 工事場所             | 工期                   | 工事概要   | 第三者適正性チェック内容             |  |  |                |
|-----------|-----------------------------|----------|-----------|------------------|----------------------|--|--------------------------|--|--|----------------|
|           |                             |          |           |                  |                      |  | 第三者チェックの該当項目             | 工事変更の内容                                    | 工事変更の理由  | 第三者の意見概要       |
| 令和8年3月24日 | 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事(その2) | 61億円     | 184億円     | 川崎市川崎区京浜運河(水江町側) | R1.10.17~<br>R8.3.25 | 本工事は、水江町側の主塔部の工場製作工、主塔架設工、主塔現場塗装工、主塔付属物工、フーチング工、中央径間部の工場製作工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、橋梁付属物工、仮設工及び調査工を施工するものである。 | 変更見込金額の合計が当初請負代金額以上となるもの | ・契約書第18条に基づく施工条件の変更<br>・契約書第19条に基づく設計図書の変更 | 工事完了に伴い、工場製作工、工場製作工(2)、地組工(1)、主塔架設工、鋼橋現場塗装工、主塔付属物工、橋梁足場等設置工、仮設工、調査工、共通仮設費の精査変更を行う。 | 工事変更内容について異論なし |

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

# 第三者適正性チェックの内容

■ 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事(その2) 受注者:MMB・宮地・川田JV  
 工事場所:川崎市川崎区京浜運河(水江町側) 工期:R1.10.17~R8.3.25

## 工事概要

本工事は、水江町側の主塔部の工場製作工、主塔架設工、主塔現場塗装工、主塔付属物工、フーチング工、中央径間部の工場製作工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、橋梁付属物工、仮設工及び調査工を施工するものである。

## 第三者チェックの該当項目


変更見込金額の合計が当初請負代金額以上となるもの

## 工事変更の内容

- ・契約書第18条に基づく施工条件の変更
- ・契約書第19条に基づく設計図書の変更

## 工事変更の理由

- ・工事完了に伴い、工場製作工、工場製作工(2)、地組工(1)、主塔架設工、鋼橋現場塗装工、主塔付属物工、橋梁足場等設置工、仮設工、調査工、共通仮設費の精査変更を行う。

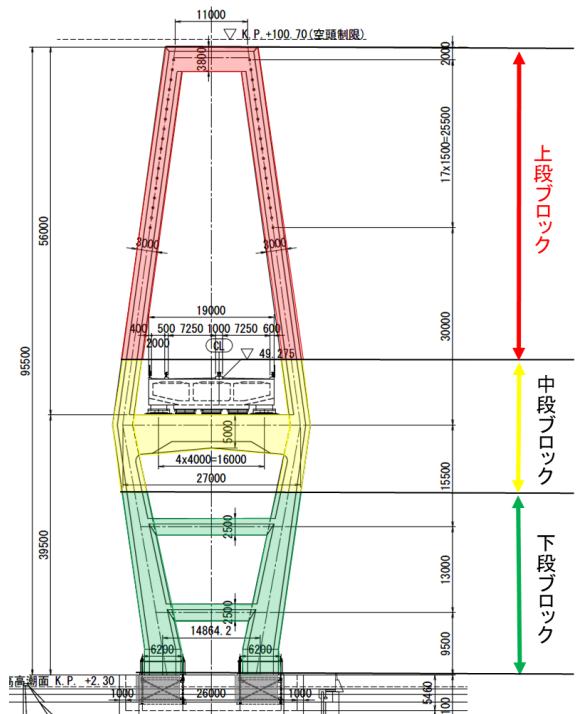

主塔正面図

